EN MARCHA: PROGRAMA ESTRATÉGICO DE OBRA PÚBLICA

2015 - 2019
VÍAS PARA LA EQUIDAD

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VÍAS PARA LA EQUIDAD
EL VIAJANO – SAN MARCOS
CÓRDOBA - SUCRE

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ADJUDICACIÓN INICIO DE OBRAS	09/11/2015 22/04/2016
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	11/12/2015
ACTA DE INICIO	28/01/2016
PLAZO	4 Años
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	Preconstrucción (68%) *ACCESOS AL PUENTE GUAYEPO

ALCANCE			
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
EL VIAJANO – SAN MARCOS	44 KM	Pavimentación	0%
PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO)	2 UN	Accesos a Puente	0,6%

CONTRATO OBRA 1696 DE 11/12/2015		
CONSORCIO MONTEGRANDE		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
CONSTRUVICOL S.A.	45	COLOMBIA
CONSTRUCCIONES VERA INTERNACIONAL S.A.S.	30	COLOMBIA
CONSTRUCTORA SL S.A.S.	20	COLOMBIA
VERA CONSTRUCCIONES SUC. COLOMBIA	5	ESPAÑA

INTERVENTORÍA 1736 DE 22/12/2015		
CONSORCIO SUPERVISIÓN EQUIDAD 115		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.	60	COLOMBIA
HMV SUPERVISIÓN S.A.S.	20	COLOMBIA
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	20	COLOMBIA

INVERSIONES (Millones)	
Total Contrato Obra	$ 119.039
Total Contrato Interventoría	$ 9.849
Total Vigencias de obra *Vigencia 2016= **$4.650*** *Vigencia 2017= **$17.670*** *Vigencia 2018= **$27.200*** *Vigencia 2019= **$69.519***	$ 119.039
Total Inversión	$ 128.888
Inversión estimada Córdoba	$ 43.939
Inversión estimada Sucre	$ 84.949

Longitud de Proyecto 49 Km

ESTADO DEL CORREDOR	
ESTADO	CANTIDAD
VÍAS PARA LA EQUIDAD	44 KM
EN EJECUCIÓN OTROS PROYECTOS	0 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	5 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	0 KM

TEMAS DE GESTIÓN		
TEMA	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL		NA
PREDIOS	CONSORCIO MONTEGRANDE	DETERMINACIÓN DE GESTIÓN PREDIAL POR ADELANTAR
REDES DE SERVICIOS PÚB.	CONSORCIO MONTEGRANDE	DETERMINACIÓN DE GESTIÓN PREDIAL POR ADELANTAR

* Cifras en millones a diciembre de 2015

VÍAS PARA LA EQUIDAD
TRANSVERSAL MONTES DE MARIA
BOLIVAR-SUCRE

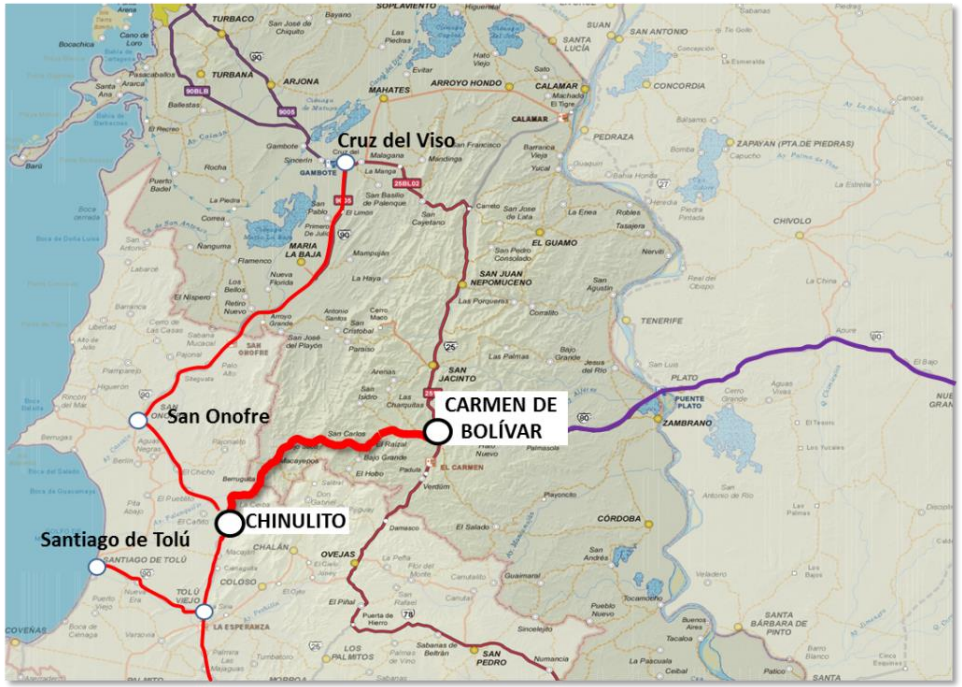

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ADJUDICACIÓN	**29/09/2015**
INICIO DE OBRAS	15/03/2016
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	09/10/2015
ACTA DE INICIO	04/12/2015
PLAZO	2 Años y 8 meses
FASE DEL PROYECTO (AVANCE)	1%

ALCANCE

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA	AVANCE
MACAYEPO – CHINULITO	6 KM	Pavimentación	0,6%
	8 UN	Puentes	0%

CONTRATO OBRA 1405 DE 09/10/2015

CONSORCIO ESTRATEGICO VE 9		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
HL INGENIEROS S.A	33	COLOMBIA
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	33	COLOMBIA
VIAS Y CANALES S.A.S	34	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1606 DE 19/11/2015

CONSORCIO ACI-TEC 4		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
ACI PROYECTOS S.A.S	40	COLOMBIA
TEC CUATRO S.A	60	ESPAÑA – SUC. COLOMBIA

TEMAS DE GESTIÓN

TEMA	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL	CARSUCRE Y CARDIQUE	PERMISOS Y PAGA
PREDIOS		NA
REDES DE SERVICIOS PÚB.	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DISEÑO DE PASOS URBANOS A INTERVENIR

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra	**$ 28.653**
Total Contrato Interventoría	$ 3.672
Total Vigencias de obra *Vigencia 2015= **$16.692*** *Vigencia 2016= **$3.840*** *Vigencia 2017= **$7.280*** *Vigencia 2018= **$841***	$ 28.653
Total Inversión	$ 32.325
Inversión estimada Bolívar	$ 16.117
Inversión estimada Sucre	$ 12.536

* Cifras en millones a diciembre de 2015

Longitud de Proyecto 44 Km

ESTADO DEL CORREDOR

ESTADO	CANTIDAD
VÍAS PARA LA EQUIDAD	6 KM
EN EJECUCIÓN OTROS PROYECTOS	20 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	8 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	10 KM

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VÍAS PARA LA EQUIDAD
COVEÑAS-MOMIL
CÓRDOBA Y SUCRE

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo	**Hasta julio 31 de 2018**
Fase del Proyecto (Avance)	PREPLIEGOS 31MAY16 CIERRE 18JUL16 ADJUDICACIÓN 23AGO16

TIPO DE INTERVENCIÓN

SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
MOMIL - SABANETA	7,6 Km	Rehabilitación
SABANETA - COVEÑAS	12,4 Km	Rehabilitación

Longitud de Proyecto 24 Km

ESTADO DEL CORREDOR

ESTADO	CANTIDAD
VÍAS PARA LA EQUIDAD	20 KM
EN EJECUCIÓN OTROS PROYECTOS	0 KM
EJECUTADOS POR OTROS PROGRAMAS	4 KM
SIN INTERVENIR – SIN FINANCIACIÓN	0 KM

TEMAS DE GESTIÓN

TEMA	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL		
PREDIOS		
REDES DE SERVICIOS PÚB.		
OTROS		
CONTRATACIÓN	INVIAS	23AGO16

INVERSIONES (Millones)

Total Contrato Obra	$ 27.900
Total Contrato Interventoría	$ 2.100
Total Vigencias *Vigencia 2017 = $16.000* *Vigencia 2018 = $14.000*	
Total Inversión	**$ 30.000**
Inversión estimada Córdoba	$ 23.400
Inversión estimada Sucre	$ 6.600

* Cifras en millones a diciembre de 2015

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
